

شماره: ۷۴۸-۹۹
تاریخ: ۹۹/۸/۸
پیوست: ۱

انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و مراکز خدماتی و بازرگانی خراسان رضوی



به نام خدا


جناب آقای دکتر شهیدی

مدیریت محترم نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی
موضوع: تأیید اصالت مکاتبات سازمان محترم برنامه و بودجه.

با سلام :

احتراماً پیرو نامه شماره ۱۵۹۴-۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۰۸ این انجمن ، با موضوع درخواست تأیید اصالت مکاتبات شماره ۱۵۳۶۰۰۴ مورخ ۹۶/۰۹/۰۵ و شماره ۳۰۲۱۳۰ مورخ ۹۷/۰۶/۱۴ رئیس محترم نظام فنی و اجرایی ، با عنایت به گذشت زمان و عدم دریافت پاسخ ، خواهشمند است در خصوص پیگیری موضوع دستورات مقتضی را مبذول فرمائید. ۱۳۷۷-۱۱-۲۰

با احترام
مهدی منوچهری
دبیر و عضو هیات مدیره
انجمن صنفی کارفرمایان خراسان رضوی



اسکن شد


مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران

<http://www.kh-syn.org>
[e-mail:syndicate@kh-syn.org](mailto:syndicate@kh-syn.org)

تلفن: ۰۵۱-۳۸۷۱۸۱۹۱

نمابر: ۰۵۱-۳۸۷۱۸۱۸۱

۲۴۲

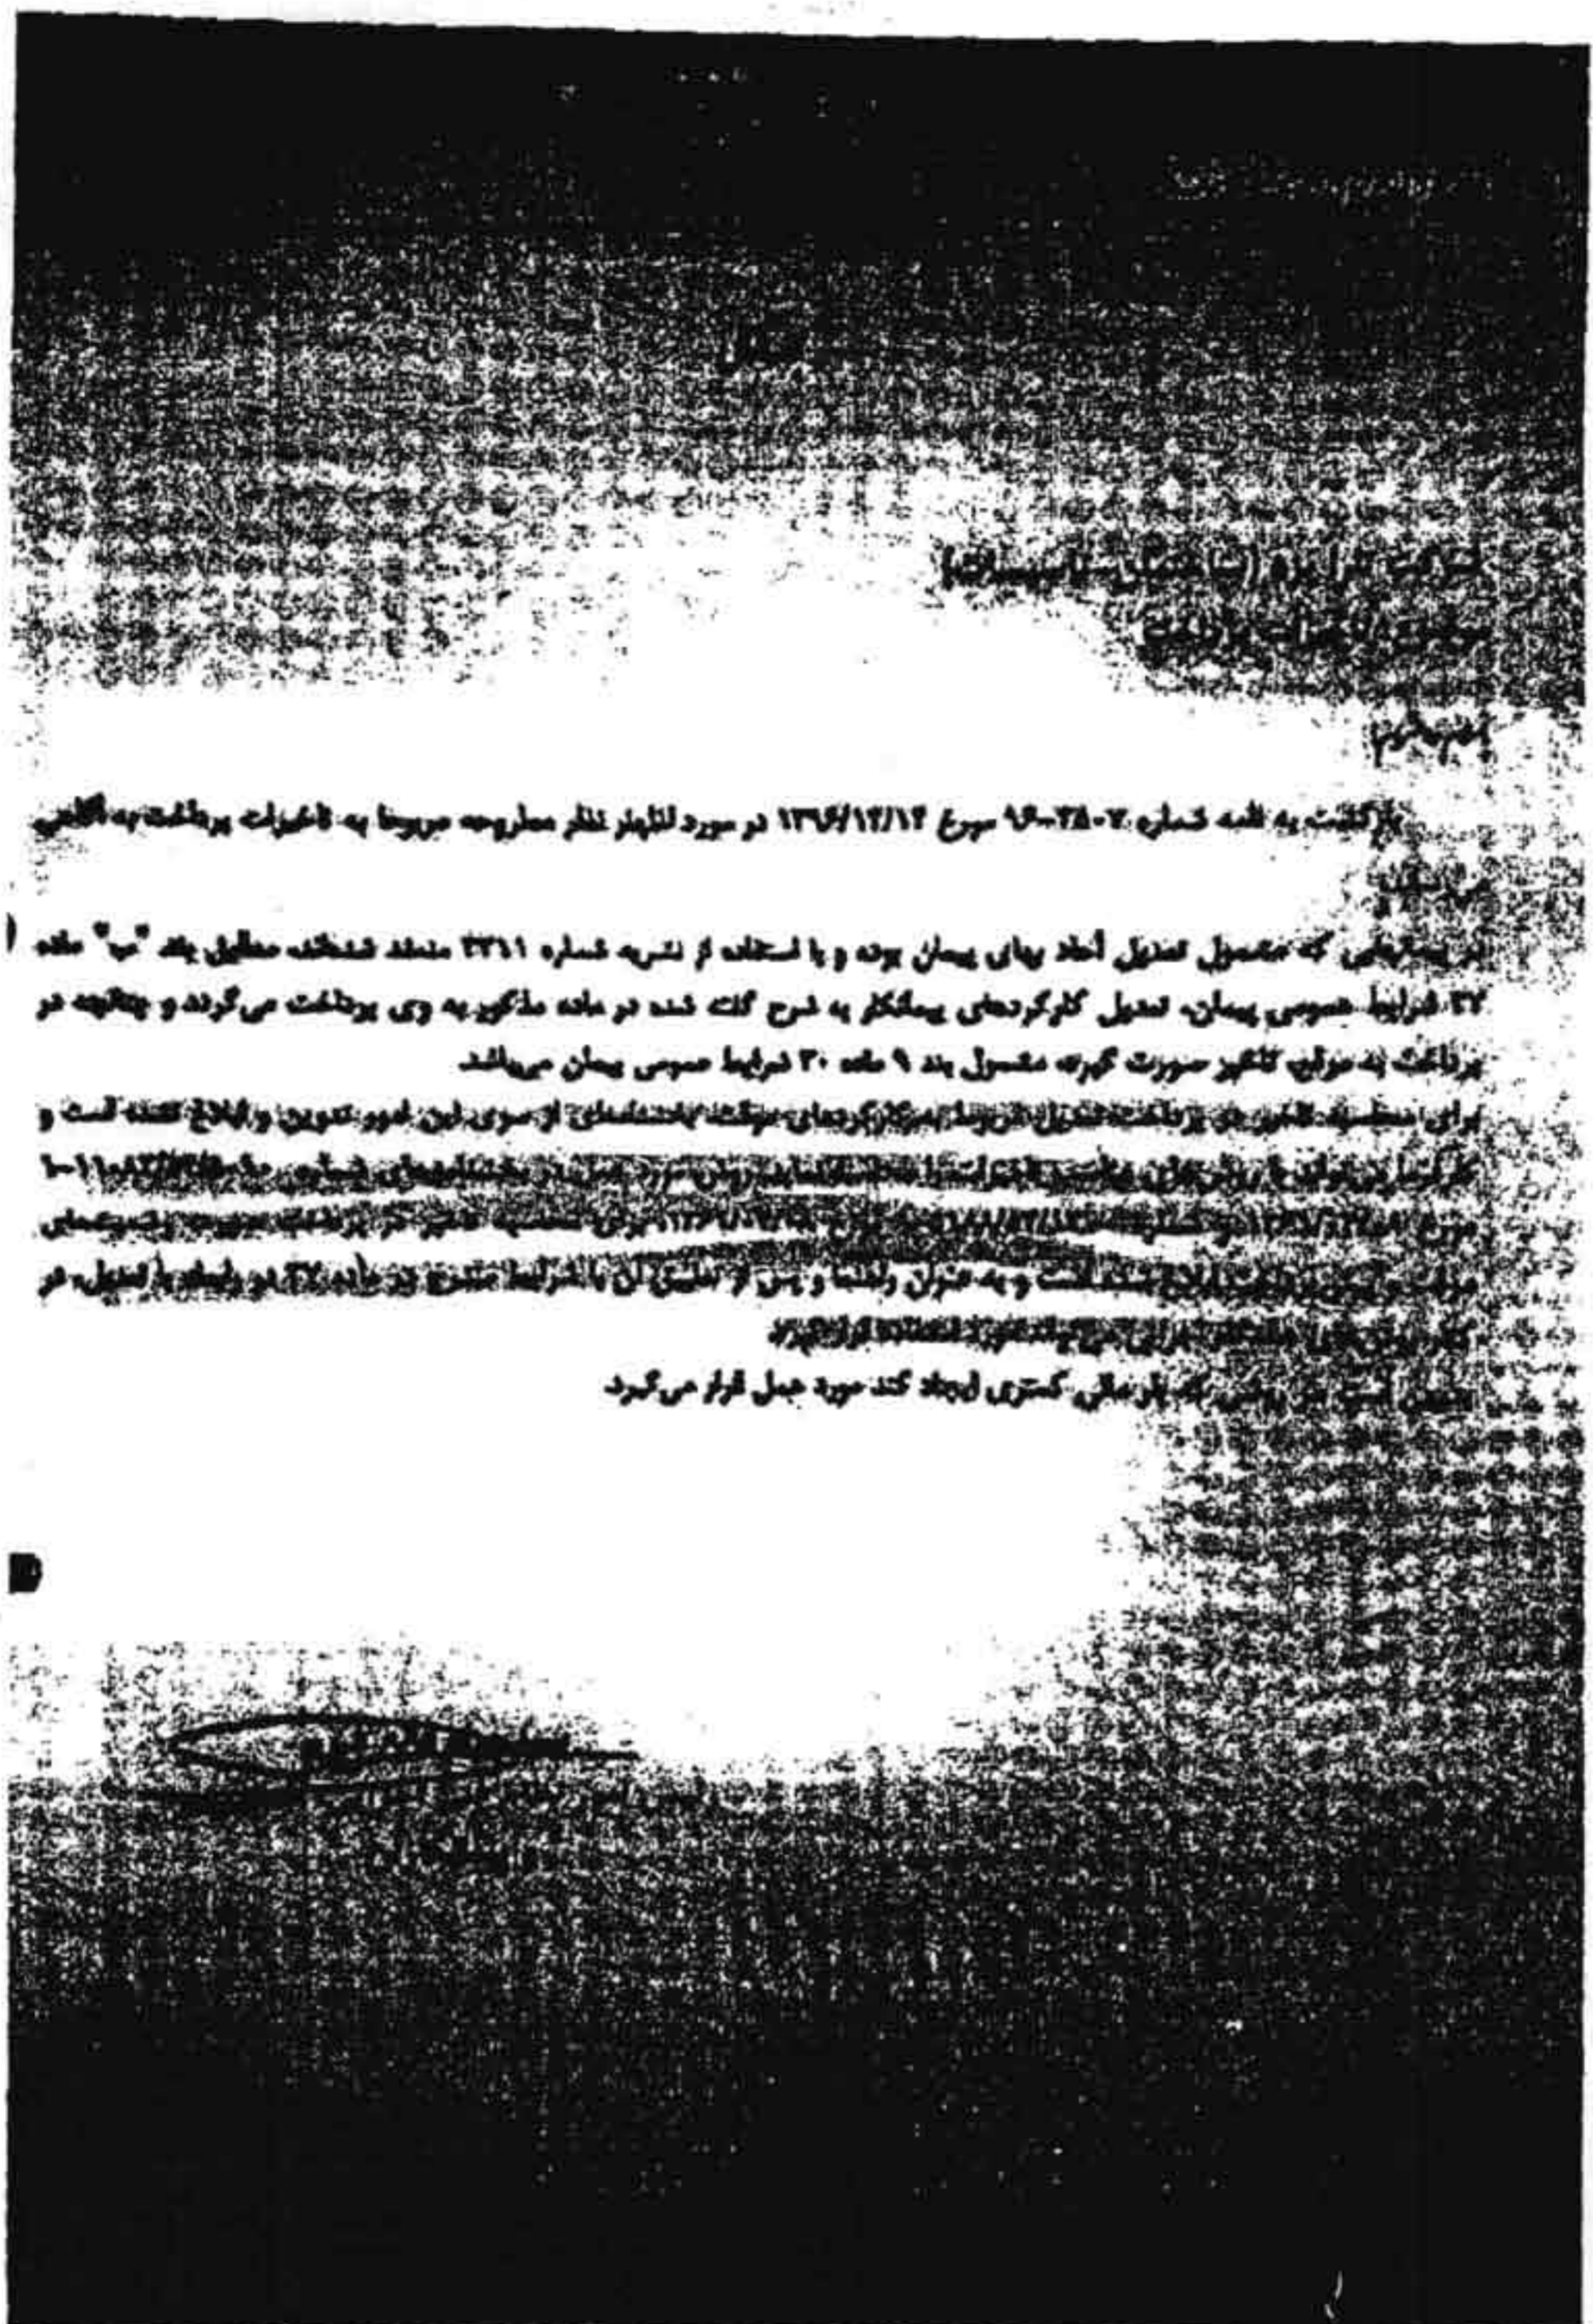

تاریخ: ۱۳۵۶/۱۲/۱۲

پژوهش به نامه شماره ۲۸۰۷-۱۳ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱۲ در مورد اظهار نظر معروضه مربوط به انحرافات پخشیه به آگاهی

در پی نامه‌ای که منتهی به اصلاح ابعاد برای پیمان بوده و با استفاده از نرسه شماره ۳۳۶۱ منطقه صنعتی مطهر بند "ب" ماده ۲۲ فرایض عمومی پیمان، جدول کارکردهای عملکرد به شرح گات شده در ماده مذکور به وی پخشیه می‌گردد و چنانچه در پخشیه بند مزبور، تکثیر صورت گرفته، منتهی به بند ۹ ماده ۲۰ فرایض عمومی پیمان می‌باشد.

بر این منتهی به تکثیر جدول کارکردها و در کارکردهای منتهی به پخشیه از سوی این امور تکثیر و ابلاغ گشته است و در این راستا به آگاهی می‌رساند که در صورت لزوم، پخشیه را به آگاهی می‌رساند.

مورخ: ۱۳۵۶/۱۲/۱۲

در صورت لزوم، پخشیه را به آگاهی می‌رساند و به عنوان راجع و پس از اتمام کار، به آگاهی می‌رساند.

تاریخ: ۱۳۵۶/۱۲/۱۲

پخشیه را به آگاهی می‌رساند.

اسکن شده



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

شماره: ۴۳۰۸۷۴
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
پست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس منوچهری

دبیر محترم انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۷۶۸-۹۹ مورخ ۹۹/۸/۸ در خصوص نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات به استحضار میرساند، در پیمانهای که مشمول تعدیل احاد بهای پیمان بوده و با استفاده از نشریه شماره ۴۳۱۱ منعقد شده‌اند، مطابق بند "ب" ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، تعدیل کارکردهای پیمانکار به شرح گفته شده در ماده مذکور به وی پرداخت می‌گردد و چنانچه در پرداخت به موقع، تاخیر صورت گیرد، مشمول بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می‌باشد. برای محاسبه تاخیر در پرداخت تعدیل مربوط به کارکردهای موقت، بخشنامه‌ای از سوی امور نظام فنی و اجرایی کشور تدوین و ابلاغ نشده است و کارفرما می‌تواند با روش‌های مناسب تاخیرات را محاسبه نماید. روش موردعمل در بخشنامه‌های شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ و شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۴/۸، برای محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای موقت و پیش پرداخت ابلاغ شده است و به عنوان راهنما و پس از تطبیق آن با شرایط مندرج در ماده ۳۷ در رابطه با تعدیل، در کنار روش‌های دستگاه اجرایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است هر روشی که بار مالی کمتری ایجاد کند مورد عمل قرار می‌گیرد.

رضا جمشیدی
رئیس سازمان
از طرف مدیران

رویه و قرائن انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی
شماره: ۱۱۵۸ - ۴۰۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۴

مرفا لطفاً با صرف نظر از این امر
انجا که در صورت لزوم (استفاده از روش مندرج در ماده ۳۷)
تایید و امضاء فرمایید

شماره: ۳۵۰۲۳۲۸۰ مرکز تلفن: ۳۵۰۲۳۲۸۰ در محل مرکزی: مشهد، بلوار دکیل آباد، نبش اقبال لاهوری. سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

۳۵۰۸۶۰۶

مهر و امضاء
۱۳۶۰/۹/۲
